

Informe Trimestral

de Actividades **abril - junio 2023**

Rodolfo Torrejón Castañeda

Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda
y Obras Públicas, Planificación y Desarrollo



Ilustres miembros del Cabildo municipal:

Es para mí un gran honor presentarles el ***Informe de Actividades de la Regiduría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Planificación y Desarrollo, correspondiente al sexto Trimestre del periodo de gestión de esta Administración 2022-2024.***

Nuestra administración ha trabajado incansablemente en el transcurso de este tiempo para mejorar la infraestructura de nuestro municipio y asegurarse de que se satisfagan las necesidades de la comunidad.

En este informe, los lectores tendrán la oportunidad de conocer más sobre las particularidades de las Comisiones que presidimos, los proyectos que llevamos a cabo, así como los desafíos que superamos y cómo lo hicimos. Esperamos que este informe les brinde una imagen clara de las actividades y de cómo estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos.

RODOLFO TORREJÓN CASTAÑEDA

*Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas,
Planificación y Desarrollo*

PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CABILDO

He participado en la toma de decisiones en forma colegiada. Para ello, informo sobre mi participación en las sesiones de Cabildo.

Sesiones de cabildo solemne

Sesión solemne de cabildo celebrada con fecha del 2 de abril del 2023

SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS

Trigésima primera sesión ordinaria de cabildo con fecha 12 de abril
Trigésima segunda sesión ordinaria de cabildo con fecha 26 de abril
Trigésima tercera sesión ordinaria de cabildo con fecha 11 de mayo
Trigésima cuarta sesión ordinaria de cabildo con fecha 24 de mayo
Trigésima quinta sesión ordinaria de cabildo con fecha 14 de junio
Trigésima sexta sesión ordinaria de cabildo con fecha 28 de junio
Trigésima séptima sesión ordinaria de cabildo con fecha 12 de julio
Trigésima octava sesión ordinaria de cabildo con fecha 26 de julio

SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS

Septuagésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo con fecha 4 de abril
Septuagésima quinta sesión extraordinaria de cabildo con fecha 4 de abril
Septuagésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo de fecha 25 de abril
Septuagésima sesión novena extraordinaria de cabildo con fecha 27 de abril
Octagésima sesión extraordinaria de cabildo con fecha 5 de mayo
Septuagésima sexta sesión extraordinaria de cabildo con fecha 5 de abril
Octagésima primera sesión extraordinaria de cabildo con fecha 23 de mayo
Octagésima segunda sesión extraordinaria de cabildo con fecha 25 de mayo
Octagésima tercera sesión extraordinaria de cabildo con fecha 13 de junio

TRABAJO COORDINADO EN COMISIONES Y COMITÉS

Una de las facultades como Regidor municipal, es vigilar la rama de la administración municipal respecto a las comisiones encomendadas. Para ello, me he mantenido en coordinación con las áreas operativas municipales.

En este contexto, presento un breve análisis de lo más relevante respecto a las comisiones en mención, a efecto de resolver los problemas municipales y vigilar que el trabajo se ajuste a las disposiciones y acuerdos del mismo.

PLANEACIÓN

Durante el segundo trimestre del año, se ejecutaron actividades propias competentes a la dirección y otras más se coadyuvó, es importante mencionar que sólo les daré un informe con las actividades más sobresalientes que se realizaron.

ABRIL 2023

“PROYECTO RASTRO MUNICIPAL”

Se coadyuvó con la Dirección de Salud en la elaboración del proyecto para la remodelación del rastro municipal.

“CAPACITACIÓN COEVAL”

Dicho evento tuvo lugar en el Municipio de Xochitepec, para dar a conocer las bases de cómo elaborar un proyecto, el cual pueda implementarse a nivel Estatal.

“INEGI”

Para dar cumplimiento con el módulo 2, del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, se realizaron mesas de trabajo con las áreas competentes para brindar la información citada.

MAYO 2023

“EVALUACIÓN BIMESTRAL”

Mediante oficio turnado a las áreas que intervienen en el desarrollo Municipal, se llevó a cabo la evaluación bimestral para verificar el avance y cumplimiento de las metas por proyecto en el Plan Municipal de Desarrollo.

“PROYECTO RASTRO MUNICIPAL”

Se realizó una visita a las instalaciones del rastro municipal de Cuernavaca, con personal de obras públicas y el encargado del rastro para unificar ideas y llevar a cabo la ejecución del proyecto municipal de Temixco.

“CUESTIONARIO INEGI”

Mesas de trabajo con las áreas encargadas de los programas para la elaboración del cuestionario módulo 2, sección III, Programas Sociales.

JUNIO 2023

“MANUAL DE ORGANIZACIÓN”

Como acuerdo en reunión de trabajo con las áreas de presidencia se llegó al acuerdo que esta dirección quedaría como enlace para la elaboración del Manual de Organización de Presidencia.

“CAPACITACIÓN IDEFOMM”

Capacitación en las instalaciones del IDEFOMM con el tema Programas Presupuestarios, impartido por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos.

“PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2023”

Mesas de trabajo con las secretarías y sus áreas para la elaboración de los PP´S 2023.

DESARROLLO URBANO

La Dirección de Desarrollo Urbano está dividida en dos Jefaturas:

- Jefatura de Uso de Suelo, Condominios y Fraccionamientos
- Jefatura de Licencias de Construcción e Inspección

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DE USO DE SUELO

Se sometió a votación de la Comisión Municipal de Fraccionamientos, Condominios, y Conjuntos Urbanos, en su tercera Sesión extraordinaria en el mes de Junio del presente año, y aprobados por mayoría dos proyectos, uno para dividir en dos fracciones y el otro para el desarrollo de trece viviendas en régimen de condominio.

<u>Tipo de tramites realizados</u>	<u>Actividades ejecutadas</u>
<u>Licencias de Uso de Suelo</u>	21
<u>Autorizaciones de división</u>	6
<u>Autorizaciones de Fusión</u>	2
<u>Constancia de Zonificación</u>	2
<u>Autorizaciones de fraccionamientos y condominios</u>	1
<u>Otros</u>	2

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN

Tipo de tramite realizados	Actividades ejecutadas
Licencia completa	32
Alineamiento y Numero Oficial	115
Constancia de Numero Oficial	10
Oficio de ocupación	40
Regularización Voluntaria	8
Otros	109
Licencia Sencilla	46

ACTIVIDADES FINANCIERAS:

A continuación, relaciono un comparativo del informe financiero del 2023, comparado con el 2022, primer año de gestión del ayuntamiento de la administración 2022-2024, donde se refleja las diferencias favor y en contra de los ingresos registrados; Así como también los descuentos que se realizaron en el 2023.

MES	2022	2023	DIRENCIAS	DESC/2023
ABRIL	\$2,073,484.38	\$ 882,269.72	- \$1,191,214.66	\$75,331.95
MAYO	\$806,557.98	\$789,429.06	- \$17,128.92	\$104,487.66
JUNIO	\$1,397,140.04	\$911,482.98	- \$485,657.06	\$70,466.93
TOTAL TRIMESTRE	\$4,277,182.40	\$2,583,181.76	- \$1,694,000.64	\$250,286.54

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Relación de las actividades operativas de las inspecciones realizadas de los meses **abril, mayo y junio 2023:**

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Reporte Ciudadanos	5	2	1
Citatorios	19	39	11
Suspensión	4	2	2
Clausuras	4	5	3
Sanción	4	5	3
Denuncias Ciudadanas Telefónicas	12	10	10
Actas Circunstanciadas en Orden de inspección	14	15	19
<i>Total, de actividades operativas de la Dirección.</i>	48	63	30

COPLADEMUN

ACTIVIDADES	PERIODO
1. Junto con la Secretaría De Obras Públicas del Ayuntamiento de Temixco Morelos se asistió al arranque de los Programas de la Dirección de Superintendencia, adscrita a la Secretaria mencionada, de los programas: <ul style="list-style-type: none"> i. -Programa Permanente de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana (bacheo) ii. -Programa de Balizamiento y Señalización. 	ABRIL
2. Se reciben y procesan 11 peticiones de obra pública de los vecinos de las colonias: <ul style="list-style-type: none"> -Acatlipa, Azteca, Lomas del Carril, Rubén Jaramillo, Eterna Primavera y, Fraccionamiento Las Cascadas 	ABRIL Y MAYO
3. Se valoran sitios idóneos para la realización de la primera Sesión de COPLADEMUN	MAYO
4. Se trabaja en colaboración con el área de Comunicación Social para la realización de un video donde se describen las acciones realizadas en el Ejercicio Fiscal 2022	MAYO
5. Se realiza un ' periódico mural ', donde a través de fotografías se describen las acciones realizadas en el Ejercicio Fiscal 2022	MAYO

<p>6. Se Celebró la Primera Sesión Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Para cual:</p> <p style="padding-left: 40px;">-Se elaboran convocatorias y se hace llegar tanto a los integrantes del Comité Permanente y la Asamblea Permanente del COPLADEMUN</p>	<p>MAYO</p>
<p>7. Se elaboró Acta de la Primera Sesión Plenaria de COPLADEMUN, donde se validó el Catálogo de Obra Pública del Municipio de Temixco y las actividades a realizar en el Ejercicio Fiscal 2023</p>	<p>JUNIO</p>
<p>8. Se mandó a la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Temixco Morelos, copia escaneada del Acta de la Primera Sesión Plenaria de COPLADEMUN solicitada por el oficio, TMX/UT/PIyS-99, de fecha 7 junio 2023</p>	<p>JUNIO</p>
<p>9. Se solventó en la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI), observaciones a la Fracción V y VI, Ejercicio Fiscal 2022, del artículo 51 de la LEY DE TRANSPARENCIA A Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS</p>	<p>JUNIO</p>
<p>10. Se realiza la integración de 20 Comités de Participación Social, bajo la normatividad del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, en las colonias, Pueblo Viejo, Col Morelos y Lauro Ortega</p>	<p>JUNIO</p>

OBRAS PÚBLICAS

		DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA				
		PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO)				
		REPORTE DE COLONIA ATENDIDAS DEL MES DE ABRIL				
No	FECHA	COLONIA	CALLE	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UTILIZADA (M3)	CONCEPTO	
1	03-abr-23	COL. ETERNA PRIMAVERA	AV. SERGIO ESTRADA CAJIGAL (1ER TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION	
2	04-abr-23	COL. ETERNA PRIMAVERA	AV. SERGIO ESTRADA CAJIGAL (2DO TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION	
		COL. ALTA PALMIRA	CALLE DEL PANTEON		3 REDUCTORES DE VELOCIDAD	
3	05-abr-23	COL. SOLIDARIDAD	AV. SERGIO ESTRADA CAJIGAL (3ER TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION	
4	11-abr-23	COL. LOMAS DE GUADALUPE	CALLE 10 DE ABRIL	4.00	BACHEO Y RENIVELACION	
		COL. LOS PRESIDENTES	CALLE ALDAMA		3 REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO VIBRADORES	
5	12-abr-23	COL. MORELOS	CALLE CHINAMECA	4.00	RENIVELACION	
		COL. AZTECA	AV.17 DE ABRIL		BACHEO	
		COL. LOMAS DE GUADALUPE	CALLE 5 DE FEBRERO (1ER TRAMO)		BACHEO Y RENIVELACION	

6	13-abr-23	COL. LOMAS DE GUADALUPE	CALLE 5 DE FEBRERO (2DO TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
			CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		
		COL. LOS PRESIDENTES	CALLE ABASOLO		BACHEO Y RENIVELACION
7	14-abr-23	COL. CAMPO SOTELOS	PROLONGACION MIGUEL HIDALGO	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
					1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
8	18-abr-23	COL. LAS ANIMAS	CALLE BUGAMBILIAS (1ER TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. ALTA PALMIRA	CARRETERA FED. CUERNAVACA - ACAPULCO		BACHEO
9	19-abr-23	COL. LAS ANIMAS	CALLE BUGAMBILIAS (2DO TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
			AV. FORTALECIMIENTO		BACHEO
10	20-abr-23	COL. LAS ANIMAS	CALLE BRISAS DE TAMPICO	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
11	21-abr-23	COL. SOLIDARIDAD	CALLE JUAN CARLOS JARQUIN	4.00	1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
			CALLE 5 DE MAYO		BACHEO, RENIVELACION Y 2 REDUCTOR DE VELOCIDAD
			AV. SOLIDARIDAD		2 REDUCTOR DE VELOCIDAD
12	24-abr-23	DELEGACION ACATLIPA	AV. DEL TRABAJO	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. 10 DE ABRIL	CALLE GUADALUPE VICTORIA		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
13	25-abr-23	COL. LOS PRESIDENTES	CALLE PORIFIRIO DIAZ	4.00	1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
			CALLE VIRGINIA FABREGAS		3 REDUCTOR DE VELOCIDAD
		COL. CENTRO DE TEMIXCO	BLVD. APATLACO		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD

		DELEGACION ACATLIPA	CALLE MIGUEL ALEMAN (1ER TRAMO)		BACHEO Y RENIVELACION
14	26-abr-23	COL. CENTRO DE TEMIXCO	BLVD. APATLACO (1ER TRAMO)	3.00	BACHEO Y RENIVELACION
15	27-abr-23	DELEGACION ACATLIPA	CALLE MIGUEL ALEMAN (2DO TRAMO)	3.00	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. CENTRO DE TEMIXCO	BLVD. APATLACO (2DO TRAMO)		BACHEO
16	28-abr-23	FRACC. LOMAS DE CUERNAVACA	CALLE MIMOSAS	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. CENTRO DE TEMIXCO	BLVD. APATLACO (3ER TRAMO)		RENIVELACION
TOTAL MES DE ABRIL (M3)				68.00	

	<p>DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA</p> <p>PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO)</p> <p>REPORTE DE COLONIAS ATENDIDAS DEL MES DE MAYO</p>	
	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 50px; margin-top: 20px;"></div>	

No	FECHA	COLONIA	CALLE	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UTILIZADA (M3)	CONCEPTO
1	02-may-23	FRACC. LOMAS DE CUERNAVACA	CALLE MELELEUCAS	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
2	03-may-23	COL. CENTRO DE TEMIXCO	AV. EMILIANO ZAPATA (S.C.A.P.S.T)	4.00	RENIVELACION
3	04-may-23	COL. 10 DE ABRIL	AV. PLAN DE AYALA	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
			CALLE 1RO DE DICIEMBRE (1ER TRAMO)		
4	05-may-23	COL. 10 DE ABRIL	CALLE 1RO DE DICIEMBRE (2DO TRAMO)	6.00	BACHEO
			CALLE GUADALUPE VICTORIA		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
			CALLE DIEZ DE ABRIL		BACHEO Y RENIVELACION
		COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE ABASOLO (1ER TRAMO)		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
		COL. CENTRO DE TEMIXCO	CALLE IGNACIO ZARAGOZA		
5	08-may-23	COL. CAMPO SOTELO	CALLEJON MIGUEL HIDALGO (1ER TRAMO)	6.00	RENIVELACION
6	09-may-23	COL. CAMPO SOTELO	CALLEJON MIGUEL HIDALGO (2DO TRAMO)	6.00	RENIVELACION

7	11-may-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE GERANIOS	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
8	12-may-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE ABASOLO (2DO TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
9	15-may-23	ZONA ARQUEOLOGICA XOCHICALCO	CARRETERA ZONA ARQUEOLOGICA XOCHICALCO	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
10	16-may-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE JAZMINES (1ER TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. AZTECA	AV. CONALEP		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
		COL. CENTRO DE TEMIXCO	AV. EMILIANO ZAPATA		BACHEO
11	17-may-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE JAZMINES (2DO TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION
			CALLE ABASOLO (3ER TRAMO)		
12	18-may-23	COL. CAMPO SOTELO	CALLEJON MIGUEL HIDALGO (3ER TRAMO)	4.00	RENIVELACION
13	19-may-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE AZUCENAS (1ER TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
14	22-may-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE AZUCENAS (2DO TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. CENTRO DE TEMIXCO	CALLE PROLONGACION NICOLAS BRAVO (1ER TRAMO)		
15	23-may-23	COL. AZTECA	CALLE TULIPANES (1ER TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION

		COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE MELCHOR OCAMPO		BACHEO
		COL. ALTA PALMIRA	CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA		
			CARRETERA FED. CUERNAVACA - ACAPULCO		
16	24-may-23	COL. CENTRO DE TEMIXCO	CALLE PROLONGACION NICOLAS BRAVO (2DO TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
17	25-may-23	COL. AZTECA	CALLE TULIPANES (2DO TRAMO)	3.00	BACHEO Y RENIVELACION
18	26-may-23	COL. ALTA PALMIRA	CALLE EJIDO (1ER TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
19	29-may-23	COL. ALTA PALMIRA	CALLE EJIDO (2DO TRAMO)	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
20	30-may-23	COL. CAMPO SOTELO	CALLE AMPLIACION MIGUEL HIDALGO	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. LOS PRESIDENTES	CALLE ALDAMA		BACHEO
21	31-may-23	COL. ALTA PALMIRA	CALLE SAN MARCOS	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
TOTAL MES DE MAYO (M3)				95.00	

	DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA	
	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO) REPORTE DE COLONIAS ATENDIDAS DEL MES DE JUNIO	

No	FECHA	COLONIA	CALLE	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UTILIZADA (M3)	CONCEPTO
1	01-jun-23	DELEGACION ACATLIPA	AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	4.00	BACHEO
			CALLE CLAVELES		
		COL. CAMPO SOTELO	CALLE AMPLIACION MIGUEL HIDALGO		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
2	02-jun-23	COL. ALTA PALMIRA	CALLE SAN MARCOS	4.00	BACHEO Y RENIVELACION
			CALLE TULIPANES		BACHEO
			CALLE DURAZNO		
			CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS		
3	05-jun-23	COL LOMAS DE CUERNAVACA	CALLE MELELEUCAS	6.00	RENIVELACION
4	06-jun-23	COL. ARBOLEDAS (ACATLIPA)	CALLE PALMA (1ER TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION
5	07-jun-23		CALLE PALMA (2DO TRAMO)	6.00	BACHEO Y RENIVELACION

		COL. ARBOLEDAS (ACATLIPA)	CALLE FRESNO		
		COL. AZTECA	CALLE TELESFORO OJEDA		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
		COL. CENTRO DE TEMIXCO	CALLE REFORMA		BACHEO
6	08-jun-23	COL. CENTRO DE TEMIXCO	AV. MIGUEL HIDALGO	4.00	BACHEO
		COL. ROSAS (ACATLIPA)	CALLE SALIAS		RENIVELACION
		COL. 10 DE ABRIL	CALLE 10 DE ABRIL		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
			CALLE 16 DE SEPTIEMBRE		2 REDUCTOR DE VELOCIDAD
			CALLE GUADALUPE VICTORIA		1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
7	09-jun-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE AMAPOLAS	4.00	1 REDUCTOR DE VELOCIDAD
			CALLE COPA DE ORO		BACHEO Y RENIVELACION
			CALLE JAZMINES		
8	12-jun-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE GARDENIAS	6	BACHEO Y RENIVELACION
9	13-jun-23	COL. CENTRO DE TEMIXCO	ENTRADA DE TIENGUIS DE TEMIXCO	4	BACHEO Y RENIVELACION
		DELEGACION RUBEN JARAMILLO	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (1ER TRAMO)		
10	14-jun-23	COL. CAMPO SOTELO	CALLEJON MIGUEL HIDALGO (4TO TRAMO)	6	RENIVELACION
11	15-jun-23	DELEGACION ACATLIPA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (2DO TRAMO)	6	BACHEO Y RENIVELACION
12	20-jun-23	DELEGACION ACATLIPA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (3ER TRAMO)	6	BACHEO Y RENIVELACION

13	21-jun-23	DELEGACION ACATLIPA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (4TO TRAMO)	6	BACHEO Y RENIVELACION
		COL. BRISAS	CALLE BRISAS DE COSUMEL		BACHEO
14	22-jun-23	COL. LOMAS DEL CARRIL	CALLE GARDENIAS	4	SOCAVON
		DELEGACION ACATLIPA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (5TO TRAMO)		BACHEO Y RENIVELACION
15	28-jun-23	DELEGACION ACATLIPA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (6TO TRAMO)	4	BACHEO Y RENIVELACION
			CALLE CONSTITUCION		BACHEO
16	29-jun-23	DELEGACION ACATLIPA	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (7MO TRAMO)	4	BACHEO Y RENIVELACION
			AV. DEL TRABAJO		BACHEO
			CALLE OJO DE AGUA		
TOTAL MES DE JUNIO (M3)				80.00	
SUMA TOTAL DEL TRIMESTRE (M3)				243.00	M3 APLICADOS DE MEZCLA ASFALTICA

 <p>TEMIXCO AYUNTAMIENTO 2022-2024</p>	<p>DIRECCIÓN DE SUPERINTENDENCIA</p> <p>PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN</p> <p>REPORTE DE COLONIAS ATENDIDAS DEL MES DE JUNIO</p>	
--	--	---

No	CONCEPTO	FECHA	COLONIA	CALLE	GUARNICIONES (ML)	
					DERECHO	IZQUIERDO
1	APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA Y ROJO EN GUARNICIONES, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	19-jun-23	Delegacion Ruben Jaramillo	Av. Insurgentes	457.20	311.18
2		20-jun-23		Calle Plan de Ayala	265.30	252.93
3				Calle Revolucion Mexicana	502.30	277.18
4		21-jun-23		Av. Leyes de Reforma	419.60	356.36
5		22-jun-23		Av. Nicolas Bravo	95.80	114.40
6				Av. Ejercito Trgarante	273.20	363.06
7		23-jun-23		Av. Salvador Allende	432.40	433.42
8		26-jun-23	Col. Centro de Temixco	Av. Plutarco elias Calle	542.20	770.96
9		27-jun-23	Poblado de Tetlama	Av. Vicente Guerrero	528.00	574.00

10			Poblado de Cuentepec	Av. Migule Hidalgo y Costilla	336.00	330.00	
11		28-jun-23	Col. Centro de Temixco	Calle Alvaro Obregon	727.74	701.10	
				Calle Reforma	51.88	54.70	
12		29-jun-23		Calle Francisco I Madero	535.50	482.60	
				Calle Venustiano Carranza	395.64	374.00	
		30-jun-23		Calle Cuahutemoc	197.67	143.80	
				Calle Ejido	122.26	130.70	
				Calle Benito Juarez	164.04	172.40	
13							
14							
SUBTOTAL					6046.73	5842.79	
TOTAL MES DE JUNIO (ML)					11889.52		

PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS Y EVENTOS MUNICIPALES

EVENTOS MUNICIPALES

Participamos en el evento de festejo para los maestros y maestras del municipio. La educación es un pilar primordial de la sociedad, fue emotivo ver tanta alegría de los festejados.




APOYOS SOCIALES

Día del niño

Como regidor de nuestra comunidad, es un honor para mí celebrar estos Festejos en honor a nuestros niños y niñas, y contribuir un poco a lograr su sonrisa. Entregamos pelotas y pastel en el




Kinder de la colonia Río Escondido de Acatlipa, así como en la Escuela primaria José Narez Álvarez de la colonia la Ribera y la Escuela primaria Lázaro Cárdenas de Acatlipa, Centro.

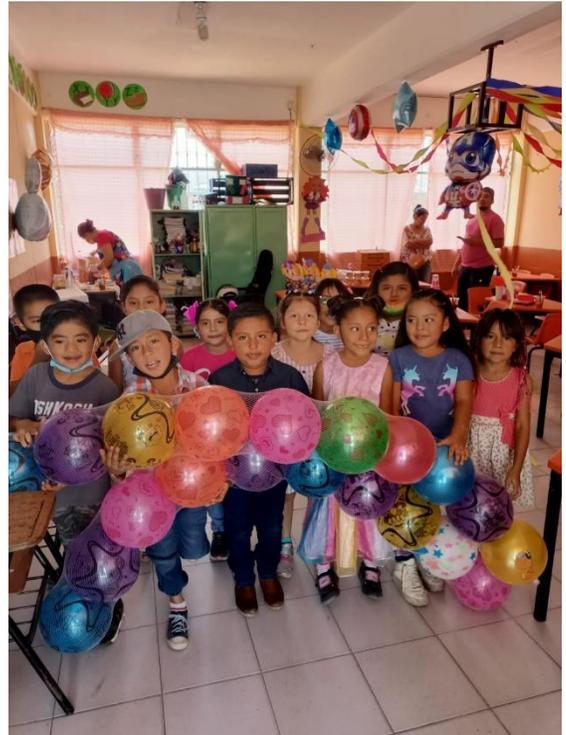



Por petición de Autoridades auxiliares y líderes sociales, hicimos llegar apoyos con pelotas y pastel para estos Festejos de Día del niño.



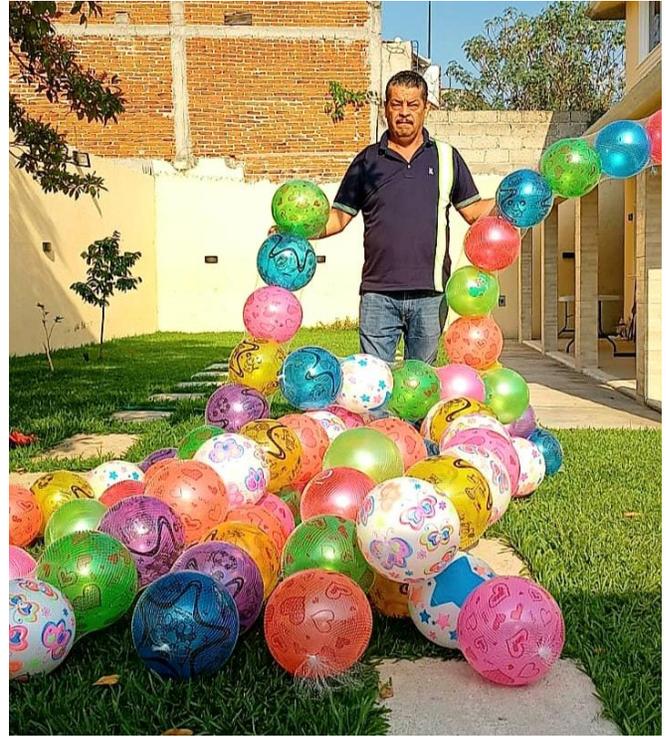

ACCIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Estamos entusiasmados de anunciar estos arranques de Obras Públicas de pavimentaciones y drenajes en nuestro querido Temixco.

Sabemos que, durante mucho tiempo, hemos enfrentado desafíos de infraestructura que afectan nuestra calidad de vida.

Gracias al esfuerzo y compromiso de todos, finalmente estamos listos para asegurarnos de dar solución a nuestras necesidades.











MUNICIPIO DE TEMIXCO 2022 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE DE PROYECTO	METAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	18-CP-03/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	MORELOS	\$412,307.23	ML	90.00
2	18-CP-04/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHINAMECA	MORELOS	\$251,988.80	ML	69.00
3	18-CP-05/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA	MORELOS	\$826,318.96	M2	532.00
4	18-CP-06/2023	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA PROFESORA AURORA PALACIOS	MORELOS	\$1,321,073.84	ML	120.20
5	18-CP-07/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA	MORELOS	\$388,015.64	ML	88.40
6	18-CP-08/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZUCENAS	MORELOS	\$384,981.73	ML	193.00
7	18-CP-09/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENAS 1RA ETAPA	MORELOS	\$3,808,373.96	M2	2,361.00
8	18-CP-10/2023	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA	PUEBLO VIEJO	\$618,206.17	M2	207.57
9	18-CP-11/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CEDRO, CAOBA Y LAUREL	PUEBLO VIEJO	\$349,524.50	ML	206.00
10	18-CP-12/2023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES OCOTE, CAOBA, CEDRO, PINO Y LAUREL	PUEBLO VIEJO	\$1,183,544.59	Postes	9.00
11	18-CP-13/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA	PUEBLO VIEJO	\$287,572.03	ML	71.30
12	18-CP-14/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 1RA ETAPA	PUEBLO VIEJO	\$581,364.24	M2	379.00
13	18-CP-15/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA NIÑOS HÉROES	PUEBLO VIEJO	\$395,882.58	ML	280.40
14	18-CP-16/2023	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA NIÑOS HÉROES	PUEBLO VIEJO	\$781,546.96	Postes	6.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO 2022 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE DE PROYECTO	METAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	18-CP-17/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARGARITAS 2DA ETAPA	LAURO ORTEGA	\$535,457.95	M2	303.00
16	18-CP-18/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JACARANDA Y PRIVADA ORQUIDEA 1RA ETAPA	LAURO ORTEGA	\$1,460,443.55	M2	751.00
17	18-CP-19/2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANENEUILCO 1RA ETAPA	RUBEN JARAMILLO	\$661,558.10	M2	498.20
18	18-CP-20/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA	RUBEN JARAMILLO	\$253,467.11	ML	182.60
19	18-CP-21/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA	RUBEN JARAMILLO	\$571,139.57	ML	182.60
20	18-CP-22/2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 1RA ETAPA	RUBEN JARAMILLO	\$2,055,347.82	M2	1,438.80
21	18-CP-23/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON	RUBEN JARAMILLO	\$1,548,413.88	ML	290.40
22	18-CP-24/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA DE LOS MANGOS	ALTA PALMIRA	\$515,893.83	ML	89.77
23	18-CP-25/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE LOS MANGOS	ALTA PALMIRA	\$847,257.02	M2	636.71
24	18-CP-26/2023	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	ALTA PALMIRA	\$788,440.81	M2	240.68
25	18-CP-27/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	ALTA PALMIRA	\$357,881.66	ML	66.00
26	18-CP-28/2023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	LOS PRESIDENTES	\$1,026,442.72	Postes	8.00
27	18-CP-29/2023	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES GUADALUPE VICTORIA Y PASCUAL ORTIZ RUBIO	LOS PRESIDENTES	\$1,293,022.90	Postes	10.00
28	18-CP-30/2023	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO DE LA HUERTA	LOS PRESIDENTES	\$812,651.73	M2	166.31



MUNICIPIO DE TEMIXCO 2022 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE DE PROYECTO	METAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
29	18-CP-31/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE 19 DE OCTUBRE	10 DE ABRIL	\$495,549.08	ML	106.42
30	18-CP-32/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 19 DE OCTUBRE	10 DE ABRIL	\$894,339.84	M2	537.80
31	18-CP-33/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	10 DE ABRIL	\$1,641,049.88	M2	801.22
32	18-CP-34/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA PRIVADA LEONA VICARIO	10 DE ABRIL	\$348,685.94	ML	69.30
33	18-CP-35/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LEONA VICARIO	10 DE ABRIL	\$684,710.23	M2	407.62
34	18-CP-36/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA 1RA ETAPA	ETERNA PRIMAVERA	\$167,919.13	ML	98.00
35	18-CP-37/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUEBLA 2DA ETAPA	ETERNA PRIMAVERA	\$863,607.70	M2	536.62
36	18-CP-38/2023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES ENCINOS, OYAMEL Y LAUREL	ETERNA PRIMAVERA	\$892,456.44	Postes	7.00
37	18-CP-39/2023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES CEIBA, ISABELES, MARGARITAS Y PRIVADA EL TRIUNFO	ETERNA PRIMAVERA	\$1,249,079.03	Postes	10.00
38	18-CP-40/2023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADAS ANTONIO VALDEZ, PARAISO, DE LAS ROSAS, LÁZARO CÁRDENAS Y 3 DE MAYO	SOLIDARIDAD	\$1,345,544.44	Postes	8.00
39	18-CP-41/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN 1RA ETAPA	SOLIDARIDAD	\$365,081.00	ML	263.38
40	18-CP-42/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN 1RA ETAPA	SOLIDARIDAD	\$2,234,128.39	M2	1,266.00
41	18-CP-43/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL	SANTA ÚRSULA	\$172,732.83	ML	140.80
42	18-CP-44/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLORÍN	SANTA ÚRSULA	\$248,678.61	ML	177.10



MUNICIPIO DE TEMIXCO 2022 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE DE PROYECTO	METAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
43	18-CP-45/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS	SANTA ÚRSULA	\$445,620.10	ML	356.40
44	18-CP-46/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ORQUÍDEA	SANTA ÚRSULA	\$143,321.05	ML	100.00
45	18-CP-47/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORQUÍDEA	SANTA ÚRSULA	\$1,257,195.55	M2	680.76
46	18-CP-48/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRASIL	AEROPUERTO	\$255,524.78	ML	196.00
47	18-CP-49/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO	AEROPUERTO	\$440,982.82	ML	94.20
48	18-CP-50/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA PERICÓN 1RA ETAPA	AEROPUERTO	\$193,055.26	ML	48.20
49	18-CP-51/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COSTA RICA	SANTA MONICA	\$1,892,919.32	M2	1,101.95
50	18-CP-52/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITALIA	SANTA MONICA	\$790,350.21	M2	375.76
51	18-CP-53/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 4 METROS	SANTA MONICA	\$1,448,370.20	M2	820.84
52	18-CP-54/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SANTA ÚRSULA 1RA ETAPA	SANTA MONICA	\$1,086,230.93	ML	335.00
53	18-CP-55/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PAZ	BENITO JUÁREZ	\$746,762.54	M2	472.25
54	18-CP-56/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VISTA HERMOSA	BENITO JUÁREZ	\$234,331.60	M2	172.10
55	18-CP-57/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAZAHUATES	BENITO JUÁREZ	\$640,207.06	ML	176.40
56	18-CP-58/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN RAMÓN	BENITO JUÁREZ	\$312,826.05	ML	95.60



MUNICIPIO DE TEMIXCO 2022 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE DE PROYECTO	METAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
57	18-CP-59/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA JACARANDAS	LAURELES	\$458,601.58	ML	68.10
58	18-CP-60/2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA JACARANDAS	LAURELES	\$644,686.14	M2	414.13
59	18-CP-61/2023	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS	LAURELES	\$240,245.07	ML	62.46
60	18-CP-62/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JACARANDAS	LAURELES	\$620,893.56	M2	351.54
61	18-CP-63/2023	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO APATLACO EN LAS AVENIDAS LAURO ORTEGA MARTINEZ Y AYUNTAMIENTO	LAS ÁNIMAS	\$1,373,386.95	ML	205.00
62	18-CP-64/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS	LAS ROSAS	\$1,540,810.07	M2	982.00
63	18-CP-65/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA COLOSIO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$536,745.08	ML	141.15
64	18-CP-66/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA COLOSIO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$1,222,352.71	M2	859.20
65	18-CP-67/2023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA OJO DE AGUA	CAMPO EL RAYO	\$1,016,334.45	Postes	6.00
66	18-CP-68/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ACATLIPA CENTRO	\$605,576.78	M2	330.87
67	18-CP-69/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 4TA PRIVADA IGNACIO ALLENDE	CASA BLANCA	\$803,007.44	M2	541.78
68	18-CP-70/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 1RA ETAPA	CASA BLANCA	\$433,292.80	M2	290.50
69	18-CP-71/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA FRESNO	ARBOLEDAS	\$418,730.90	ML	80.10
70	18-CP-72/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA PRIVADA FRESNO	ARBOLEDAS	\$547,626.23	M2	439.00



MUNICIPIO DE TEMIXCO 2022 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE DE PROYECTO	METAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
71	18-CP-73/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA PALMITA Y CALLE PINO	ARBOLEDAS	\$432,072.19	ML	112.82
72	18-CP-74/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA PALMITA Y CALLE PINO	ARBOLEDAS	\$1,084,794.64	M2	654.60
73	18-CP-75/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 2DA PRIVADA PALMA	ARBOLEDAS	\$357,656.76	ML	83.03
74	18-CP-76/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA PRIVADA PALMA	ARBOLEDAS	\$726,712.80	M2	470.00
75	18-CP-77/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 8 DE MAYO	LOMAS DEL CARRIL	\$723,492.30	M2	292.42
76	18-CP-78/2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESMER SOLIS	LOMAS DEL CARRIL	\$2,114,368.80	M2	732.86
77	18-CP-79/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MAGNOLIAS 1RA ETAPA	LOMAS DEL CARRIL	\$514,984.13	ML	65.30
78	18-CP-80/2023	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE MAGNOLIAS 1RA ETAPA	LOMAS DEL CARRIL	\$1,862,888.74	M2	237.79
79	18-CP-81/2023	REHABILITACIÓN DEL CAIC ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA	LOMAS DEL CARRIL	\$2,200,000.00	M2	224.29
80	18-CP-82/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR	SAN AGUSTIN TETLAMA	\$365,077.42	ML	271.00
81	18-CP-83/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL 2DA	SAN AGUSTIN TETLAMA	\$641,271.99	ML	191.00
82	18-CP-84/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA VIVEROS 1RA ETAPA	SAN AGUSTIN TETLAMA	\$593,618.79	M2	321.40
83	18-CP-85/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA BUGAMBILIAS	AZTECA	\$536,624.27	ML	109.85
84	18-CP-86/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BUGAMBILIAS	AZTECA	\$755,902.18	M2	621.84



MUNICIPIO DE TEMIXCO 2022 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)



No.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE DE PROYECTO	METAS	
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
85	18-CP-87/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA AZALEAS	AZTECA	\$1,023,263.71	M2	769.78
86	18-CP-88/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZALEAS	AZTECA	\$826,402.61	M2	482.62
87	18-CP-89/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARTICULO 123 1RA ETAPA	LOMAS DE GUADALUPE	\$3,073,360.74	ML	670.20
88	18-CP-90/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS 1RA ETAPA	CUENTEPEC	\$1,295,633.02	M2	819.40
89	18-CP-91/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA (CAMINO CUENTEPEC - AHUATENCO) 1RA ETAPA	CUENTEPEC	\$564,139.44	ML	157.40
90	18-CP-92/2023	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA (CAMINO CUENTEPEC - AHUATENCO) 1RA ETAPA	CUENTEPEC	\$219,555.08	ML	152.73
91	18-CP-93/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA	CUENTEPEC	\$821,787.40	M2	596.05
92	18-CP-94/2023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO	MIGUEL HIDALGO	\$1,178,020.54	Postes	8.00
93	18-CP-95/2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA LOS REYES	CAMPO SOTELO	\$2,110,984.83	M2	1,157.08
94	18-CP-96/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA	ESTRIBO	\$817,925.49	ML	181.36
95	18-CP-97/2023	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA	ESTRIBO	\$287,607.76	ML	186.00
96	18-CP-98/2023	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIAS 1RA ETAPA	ESTRIBO	\$1,570,461.72	M2	879.00
TOTAL				\$82,970,277.00		



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



OBRAS INICIADAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) EJERCICIO 2023

Nº.	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	IMPORTE DE PRESUPUESTO
1	FORTAMUNDF-01/2023	TEMIXCO-SOP-C-FORTAMUNDF-01/2023	PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO)	TEMIXCO	\$1,500,000.00
2	FORTAMUNDF-02/2023	TEMIXCO-SOP-C-AD-FORTAMUNDF-02/2023	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN	TEMIXCO	\$2,000,000.00
3	FORTAMUNDF-03/2023	TEMIXCO-SOP-C-AD-FORTAMUNDF-03/2023	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS	TEMIXCO	\$1,000,000.00

RECURSOS FISCALES EJERCICIO 2023 (RECURSOS PROPIOS)

Nº.	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	IMPORTE DE PRESUPUESTO
1	RP-03/2023	TEMIXCO-SOP-C-AD-RP-03/2023	DESASOLVE DEL CANAL EN AV. DEL TRABAJO	VERGEL SANTA CRUZ	\$166,722.73
2	RP-04/2023	TEMIXCO-SOP-C-IR-RP-04/2023	REHABILITACIÓN DEL PARADERO Y MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA	LAS ANIMAS	\$2,540,053.29



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO



AVANCE FISICO

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) EJERCICIO 2023

N°.	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	AVANCE FISICO
1	FORTAMUNDF-01/2023	TEMIXCO-SOP-C-FORTAMUNDF-01/2023	PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA URBANA (BACHEO)	TEMIXCO	53%
2	FORTAMUNDF-02/2023	TEMIXCO-SOP-C-AD-FORTAMUNDF-02/2023	PROGRAMA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN	TEMIXCO	59%
3	FORTAMUNDF-03/2023	TEMIXCO-SOP-C-AD-FORTAMUNDF-03/2023	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS	TEMIXCO	SE ENCUENTRA EN TRAMITE SU PAGO DE ANTICIPO

RECURSOS FISCALES EJERCICIO 2023 (RECURSOS PROPIOS)

N°.	NO. DE OBRA	NO. DE CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	COLONIA	AVANCE FISICO
1	RP-03/2023	TEMIXCO-SOP-C-AD-RP-03/2023	DESASOLVE DEL CANAL EN AV. DEL TRABAJO	VERGEL SANTA CRUZ	100%
2	RP-04/2023	TEMIXCO-SOP-C-IR-RP-04/2023	REHABILITACIÓN DEL PARADERO Y MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA	LAS ANIMAS	3%
